Project 056
Frisostraat / Plein 1940 Zevenbergschen Hoek

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaand taken
1					
2	**ONTWERPFASE**	**1295 dagen?**	**maa 2-7-12**	**vri 16-6-17**	
3	**Bestemmingsplan**	**741 dagen**	**maa 2-7-12**	**maa 4-5-15**	
9	**(Steden)bouwkundig ontwerp**	**215 dagen?**	**maa 22-8-16**	**vri 16-6-17**	
10	Uitwerken plan (ruimtelijk & financieel) door Koers iom gemeente	94 dagen?	maa 22-8-16	don 29-12-16	
11	Besluit B&W mbt principeverzoek	1 dag?	vri 30-12-16	vri 30-12-16	10
12	Bouwkundig ontwerp (VO)	2 mndn	maa 2-1-17	vri 24-2-17	11
13	Inrichtingsplan openbare ruimte (VO)	2 mndn	maa 2-1-17	vri 24-2-17	11
14	Bouwkundig ontwerp (DO)	2 mndn	maa 27-2-17	vri 21-4-17	12
15	Inrichtingsplan openbare ruimte (DO)	2 mndn	maa 27-2-17	vri 21-4-17	13
16	Bestek bouwkundig ontwerp	2 mndn	maa 24-4-17	vri 16-6-17	14
17	Bestek inrichting openbare ruimte	2 mndn	maa 24-4-17	vri 16-6-17	15
18					
19	**UITVOERINGSFASE**	**547 dagen**	**don 24-11-16**	**vri 28-12-18**	
20	**Verhuur/verkoop**	**200 dagen**	**don 24-11-16**	**woe 30-8-17**	**E-27 dagen**
21	Voorbereidingen verhuur/verkoop	2 mndn	don 24-11-16	woe 18-1-17	8
22	Verhuur/verkoop	8 mndn	don 19-1-17	woe 30-8-17	21
23	**Voorbereidingen**	**60 dagen**	**maa 19-6-17**	**vri 8-9-17**	
24	Aanbesteding bouwkundige werken	3 mndn	maa 19-6-17	vri 8-9-17	16
25	Aanbesteding inrichting openbare ruimte	3 mndn	maa 19-6-17	vri 8-9-17	17
26	**Vergunningverstrekking**	**80 dagen**	**maa 19-6-17**	**vri 6-10-17**	
27	Voorbereiding aanvraag omgevingsvergunning	2 mndn	maa 19-6-17	vri 11-8-17	16
28	Omgevingsvergunning woningbouw (sloop, bouw, aanleg)	2 mndn	maa 14-8-17	vri 6-10-17	27
29	Verkeersbesluit	2 mndn	maa 14-8-17	vri 6-10-17	27
30	**Bouw**	**320 dagen**	**maa 9-10-17**	**vri 28-12-18**	
31	Bouwrijp maken terrein/sloop	2 mndn	maa 9-10-17	vri 1-12-17	28
32	Bouwactiviteiten	10 mndn	maa 4-12-17	vri 7-9-18	31
33	Woonrijp maken terrein	3 mndn	maa 10-9-18	vri 30-11-18	32
34	Oplevering	1 mnd	maa 3-12-18	vri 28-12-18	33
35					
36	**AFRONDINGSFASE**	**81 dagen**	**maa 31-12-18**	**maa 22-4-19**	
37	**Evaluatierapport**	**81 dagen**	**maa 31-12-18**	**maa 22-4-19**	
38	Evaluatiegesprekken	1 mnd	maa 31-12-18	vri 25-1-19	34
39	Rapportage opstellen	1 mnd	maa 28-1-19	vri 22-2-19	38
40	Besluit directie	1 mnd	maa 25-2-19	vri 22-3-19	39
41	Besluit college	1 mnd	maa 25-3-19	vri 19-4-19	40
42	Afsluiting project	1 dag	maa 22-4-19	maa 22-4-19	41

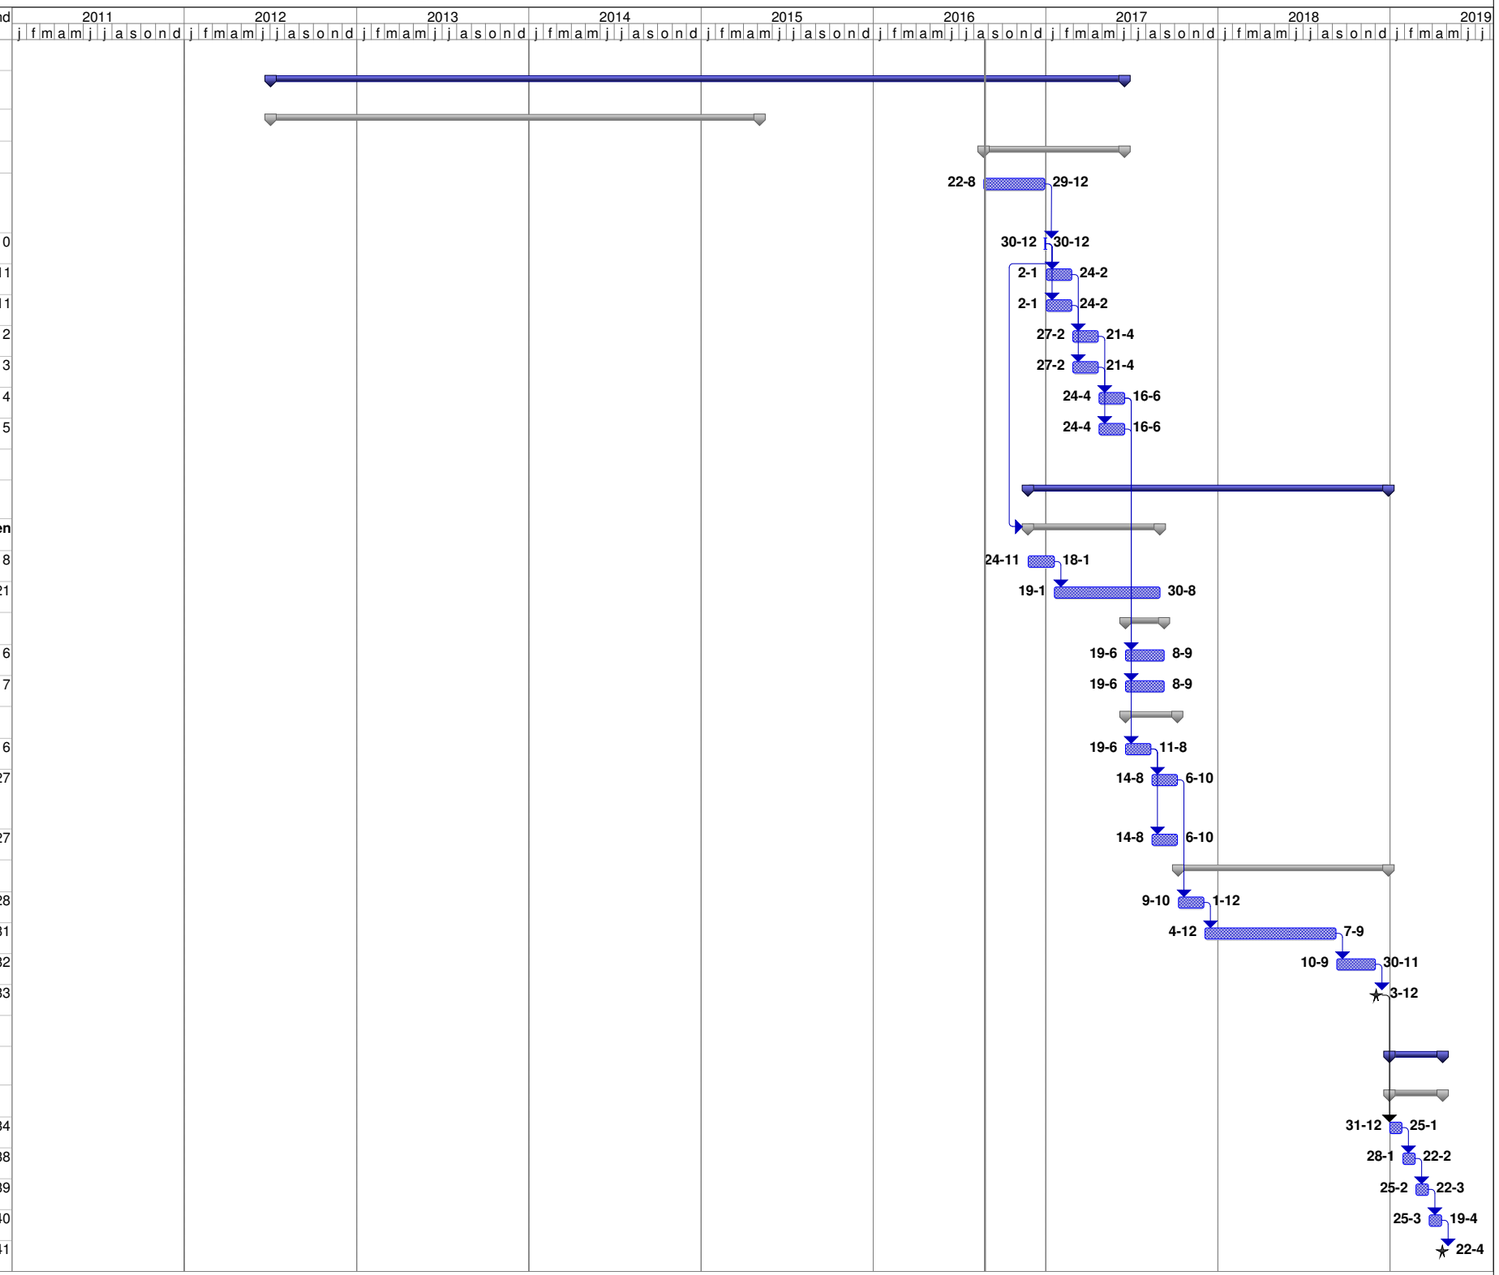

Project 056 Frisostraat / Plein 1940 Zevenbergschen Hoek
Datum: don 25-8-16

Taak	Samengevouwen mijlpaal	Projectsamenvatting	Inactieve mijlpaal	Handmatige samenvatting	Voortgang		
Mijlpaal	Samengevouwen voortgang	Groeperen op samenvattingskop	Inactieve samenvatting	Handmatige samenvatting			
Samenvatting	Splitsing	Inactieve taken	Handmatig taak	Alleen begindatum			
Samengevouwen taak	Externe taken	Inactieve taken	Alleen duur	Alleen einddatum			
