PLANNING PROJECT 128. Herontwikkeling Evenemententerrein Klundert

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaa taken
1	**INTAKEFASE**	**91 dagen**	**don 10-8-06**	**don 14-12-06**	
10					
11	**INITIATIEFFASE**	**260 dagen**	**vri 15-12-06**	**don 13-12-07**	1
15					
16	**ONTWERPFASE**	**536,06 dagen**	**vri 14-12-07**	**maa 4-1-10**	11
44					
45	**UITVOERINGSFASE**	**2626,56 dagen**	**vri 17-10-08**	**maa 12-11-18**	
46	**Realisatie bestekken sportpark civiel**	12 mndn	vri 17-10-08	don 17-9-09	18
47	**Realisatie bestekken sportpark bouwkundig**	12 mndn	vri 17-10-08	don 17-9-09	19
48	**Bouwrijp maken evenemententerrein**	8 mndn	maa 4-1-10	maa 16-8-10	42;21
49	**Overige vergunningen**	3 mndn	maa 4-1-10	maa 29-3-10	42
50	**Kaveluitgifte Van Strijenstraat**	6 mndn	maa 1-3-10	maa 16-8-10	48GE
51	**Bouwvergunningen**	6 mndn	maa 4-1-10	maa 21-6-10	42
52	**Realisatie bouwprogramma fase 1 (incl Van Strijenstraat)**	24 mndn	maa 16-8-10	maa 18-6-12	48;49;51
53	**Realisatie bouwprogramma fase 2 (Sandefjord)**	12 mndn	vri 1-8-14	vri 3-7-15	
54	**Realisatie bouwprogramma fase 3 (Hamar)**	12 mndn	maa 4-1-16	maa 5-12-16	
55	**Realisatie bouwprogramma fase 4 (Oslo & Lillehammer)**	18 mndn	maa 5-12-16	maa 23-4-18	54
56	**Woonrijp maken Van Strijenstraat**	3 mndn	maa 18-6-12	maa 10-9-12	52
57	**Woonrijp maken Fase 1 (Stavanger)**	**541,5 dagen**	**maa 18-6-12**	**din 15-7-14**	
73	**Woonrijp maken Fase 2 (Brink & Sandefjord)**	**170 dagen**	**vri 27-2-15**	**vri 23-10-15**	68
77	**Woonrijp maken Fase 3 (Kristiansand & Hamar)**	**130 dagen**	**maa 28-11-16**	**maa 29-5-17**	
78	Besteksuitwerking	3 mndn	maa 28-11-16	maa 20-2-17	54BE-4,5 d
79	Aanbesteding	1,5 mndn	maa 20-2-17	maa 3-4-17	78
80	Uitvoering	2 mndn	maa 3-4-17	maa 29-5-17	79
81	**Woonrijp maken Fase 4 (resterende buitenruimte)**	**150 dagen**	**maa 16-4-18**	**maa 12-11-18**	
82	Besteksuitwerking	3 mndn	maa 16-4-18	maa 9-7-18	55BE-4,5 d
83	Aanbesteding	1,5 mndn	maa 9-7-18	maa 20-8-18	82
84	Uitvoering	3 mndn	maa 20-8-18	maa 12-11-18	83
85	**AFRONDINGSFASE**	**35 dagen**	**maa 12-11-18**	**maa 31-12-18**	45
86	**Evaluatierapport**	**25 dagen**	**maa 12-11-18**	**maa 17-12-18**	
87	rapportage	3 wkn	maa 12-11-18	maa 3-12-18	
88	besluit college	2 wkn	maa 3-12-18	maa 17-12-18	87
89	**Administratieve afronding**	2 wkn	maa 17-12-18	maa 31-12-18	86

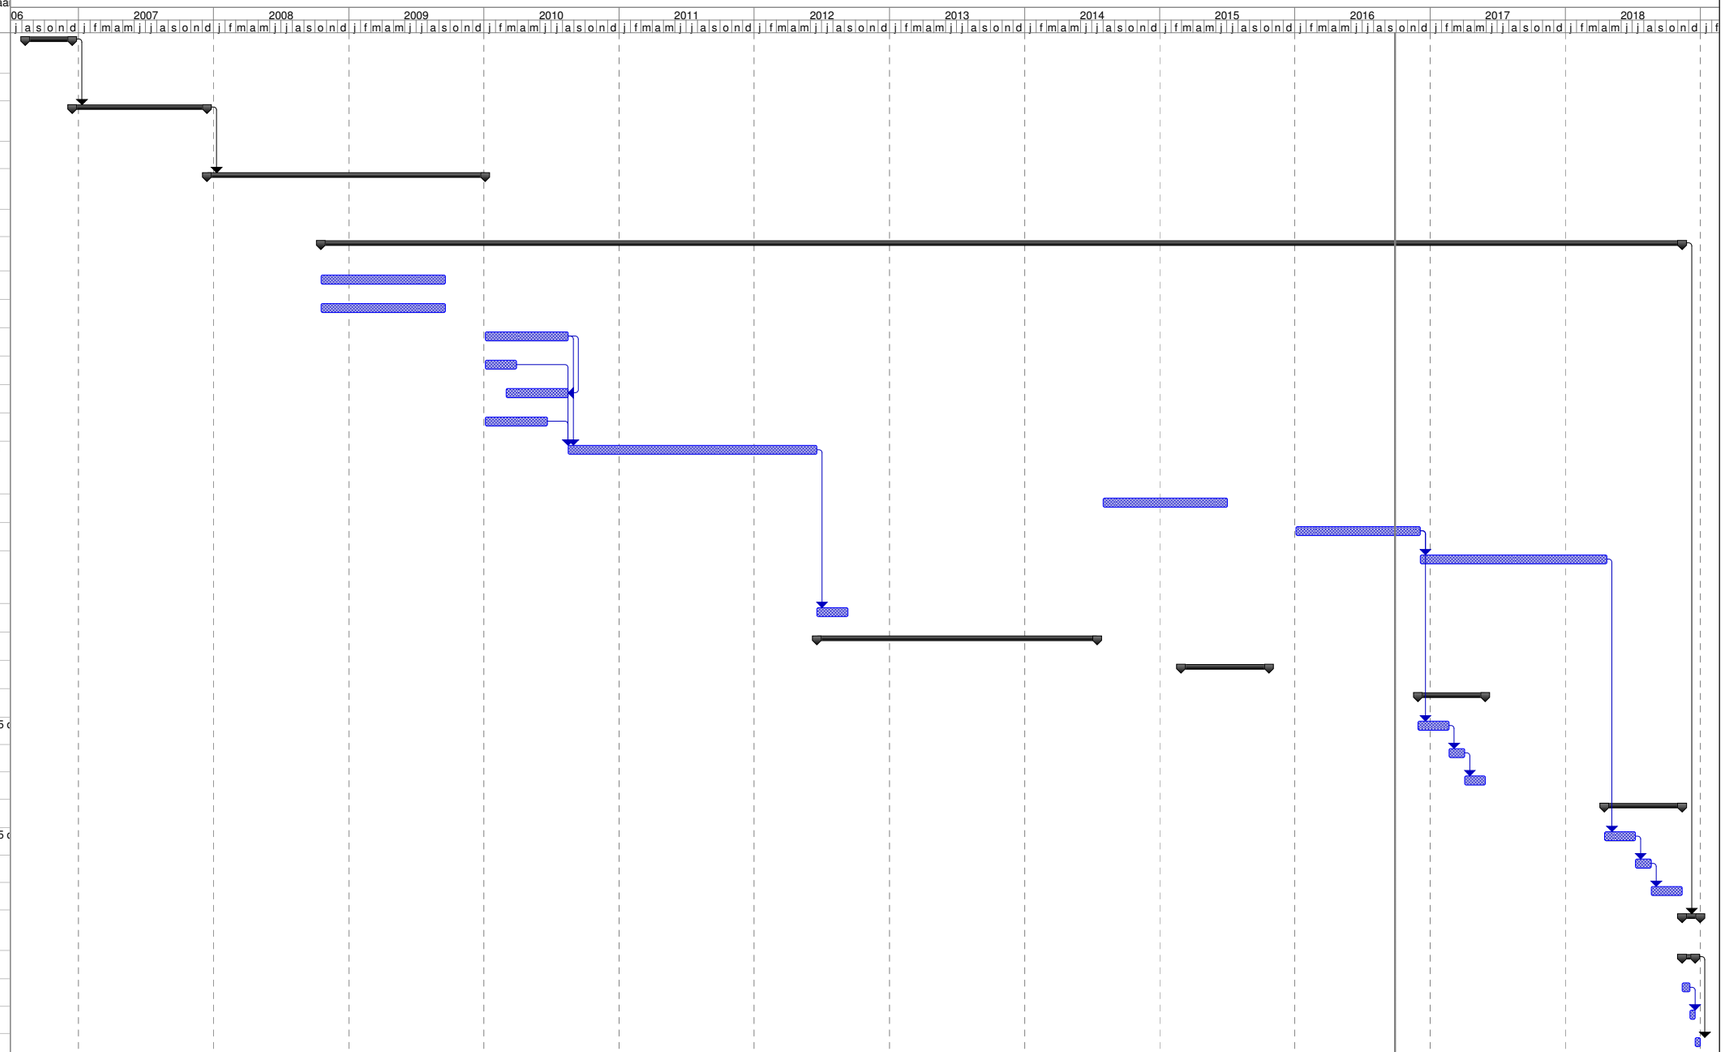

Project 128. Herontwikkeling Eveneme
Versie 1
Datum: woe 28-9-16

Taak | Samengevouwen taak | Splitsing | Groeperen op samenvattingskop | Inactieve mijlpaal | Alleen duur | Alleen begindatum
Mijlpaal | Samengevouwen mijlpaal | Externe taken | Inactieve taken | Inactieve samenvatting | Handmatige samenvatting | Alleen einddatum
Samenvatting | Samengevouwen voortgang | Projectsamenvatting | Inactieve taken | Handmatig taak | Handmatige samenvatting | Voortgang
