Planning 132. Aanleunwoningen De Westhoek Zevenbergen

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken
1	**INTAKEFASE**	**645 dagen**	**din 18-1-05**	**din 10-7-07**	
12					
13	**INITIATIEFFASE**	**726 dagen**	**woe 12-9-07**	**don 24-6-10**	1
14	**Haalbaarheidsonderzoek**	**636 dagen**	**woe 12-9-07**	**don 18-2-10**	
15	startoverleg met initiatiefnemer	1 dag	woe 12-9-07	don 13-9-07	
16	onderzoek (milieu, belemmeringen, eigendomsposities)	127 wkn	don 13-9-07	don 18-2-10	15
17	programma van eisen	12 wkn	don 26-11-09	don 18-2-10	16GE
18	visie	16 wkn	don 29-10-09	don 18-2-10	17GE
19	ruimtelijke vormgeving	20 wkn	don 1-10-09	don 18-2-10	18GE
20	projectexploitatie + risicoanalyse	12 wkn	don 26-11-09	don 18-2-10	19GE
21	communicatieplan	4 wkn	don 21-1-10	don 18-2-10	20GE
22	**Locatieontwikkelingsovereenkomst**	**80 dagen**	**don 18-2-10**	**don 10-6-10**	
23	overeenstemming met initiatiefnemer	1 mnd	don 18-2-10	don 18-3-10	19
24	besluit college en raad	3 mndn	don 18-3-10	don 10-6-10	23
25	**Evaluatie fase (rapport bestuur + intern)**	2 wkn	don 10-6-10	don 24-6-10	24
26					
27	**ONTWERPFASE**	**1937 dagen**	**don 10-6-10**	**vri 10-11-17**	
28	**Bestemmingsplan**	**909 dagen**	**don 10-6-10**	**woe 4-12-13**	
29	Technische onderzoeken	3 mndn	don 10-6-10	don 2-9-10	24
30	Bestemmingsplan opstellen	14 mndn	don 2-9-10	don 29-9-11	29
31	Nominale procedure	15 mndn	don 29-9-11	don 22-11-12	30
32	Bezwaar en beroepsprocedure	269 dagen	don 22-11-12	woe 4-12-13	31
33	**Ontwerp**	**180 dagen**	**don 15-3-12**	**don 22-11-12**	
34	Stedenbouwkundig ontwerp	8 wkn	don 15-3-12	don 10-5-12	35EB
35	Bouwkundig ontwerp	4 mndn	don 10-5-12	don 30-8-12	36EB
36	Inrichtingsplan	3 mndn	don 30-8-12	don 22-11-12	31GE
37	**Discussie corporatie over voortzetting**	58 mndn	maa 3-6-13	vri 10-11-17	
38					
39	**UITVOERINGSFASE**	**1389 dagen**	**woe 4-12-13**	**maa 1-4-19**	
40	**Grondtransactie**	**61 dagen**	**maa 13-11-17**	**maa 5-2-18**	
41	Opstellen notariele akte	4 wkn	maa 13-11-17	vri 8-12-17	32;37
42	Overeenstemming	2 mndn	maa 11-12-17	vri 2-2-18	41
43	Passeren	1 dag	maa 5-2-18	maa 5-2-18	42
44	**Vergunningen**	13 wkn	woe 4-12-13	woe 5-3-14	36;32
45	**Bouwrijpmaken**	**1149 dagen**	**woe 4-12-13**	**maa 30-4-18**	
46	bestek	11 wkn	woe 4-12-13	woe 19-2-14	32
47	aanbesteding	6 wkn	woe 19-2-14	woe 2-4-14	46
48	gunning	4 wkn	woe 2-4-14	woe 30-4-14	47
49	uitvoering (sloop, sanering, brm)	12 wkn	din 6-2-18	maa 30-4-18	48;43
50	**Bouw**	40 wkn	din 1-5-18	maa 4-2-19	49
51	**Woonrijpmaken**	**145 dagen**	**din 11-9-18**	**maa 1-4-19**	
52	bestek	11 wkn	din 11-9-18	din 27-11-18	53EB
53	aanbesteding	6 wkn	din 27-11-18	din 8-1-19	54EB
54	gunning	4 wkn	din 8-1-19	din 5-2-19	55EB
55	uitvoering (wrm)	8 wkn	din 5-2-19	maa 1-4-19	50
56	**Toezicht op uitvoering**	**270 dagen**	**din 6-2-18**	**maa 18-2-19**	
57	directievoering	54 wkn	din 6-2-18	maa 18-2-19	49GB
58	toezicht	54 wkn	din 6-2-18	maa 18-2-19	49GB
59	**Evaluatie fase (rapport bestuur + intern)**	3 dagen	din 19-2-19	don 21-2-19	56
60					
61	**AFRONDINGSFASE**	**50 dagen**	**din 2-4-19**	**maa 10-6-19**	39
62	**Evaluatierapport**	**40 dagen**	**din 2-4-19**	**maa 27-5-19**	
69	**Administratieve afronding**	2 wkn	din 28-5-19	maa 10-6-19	62

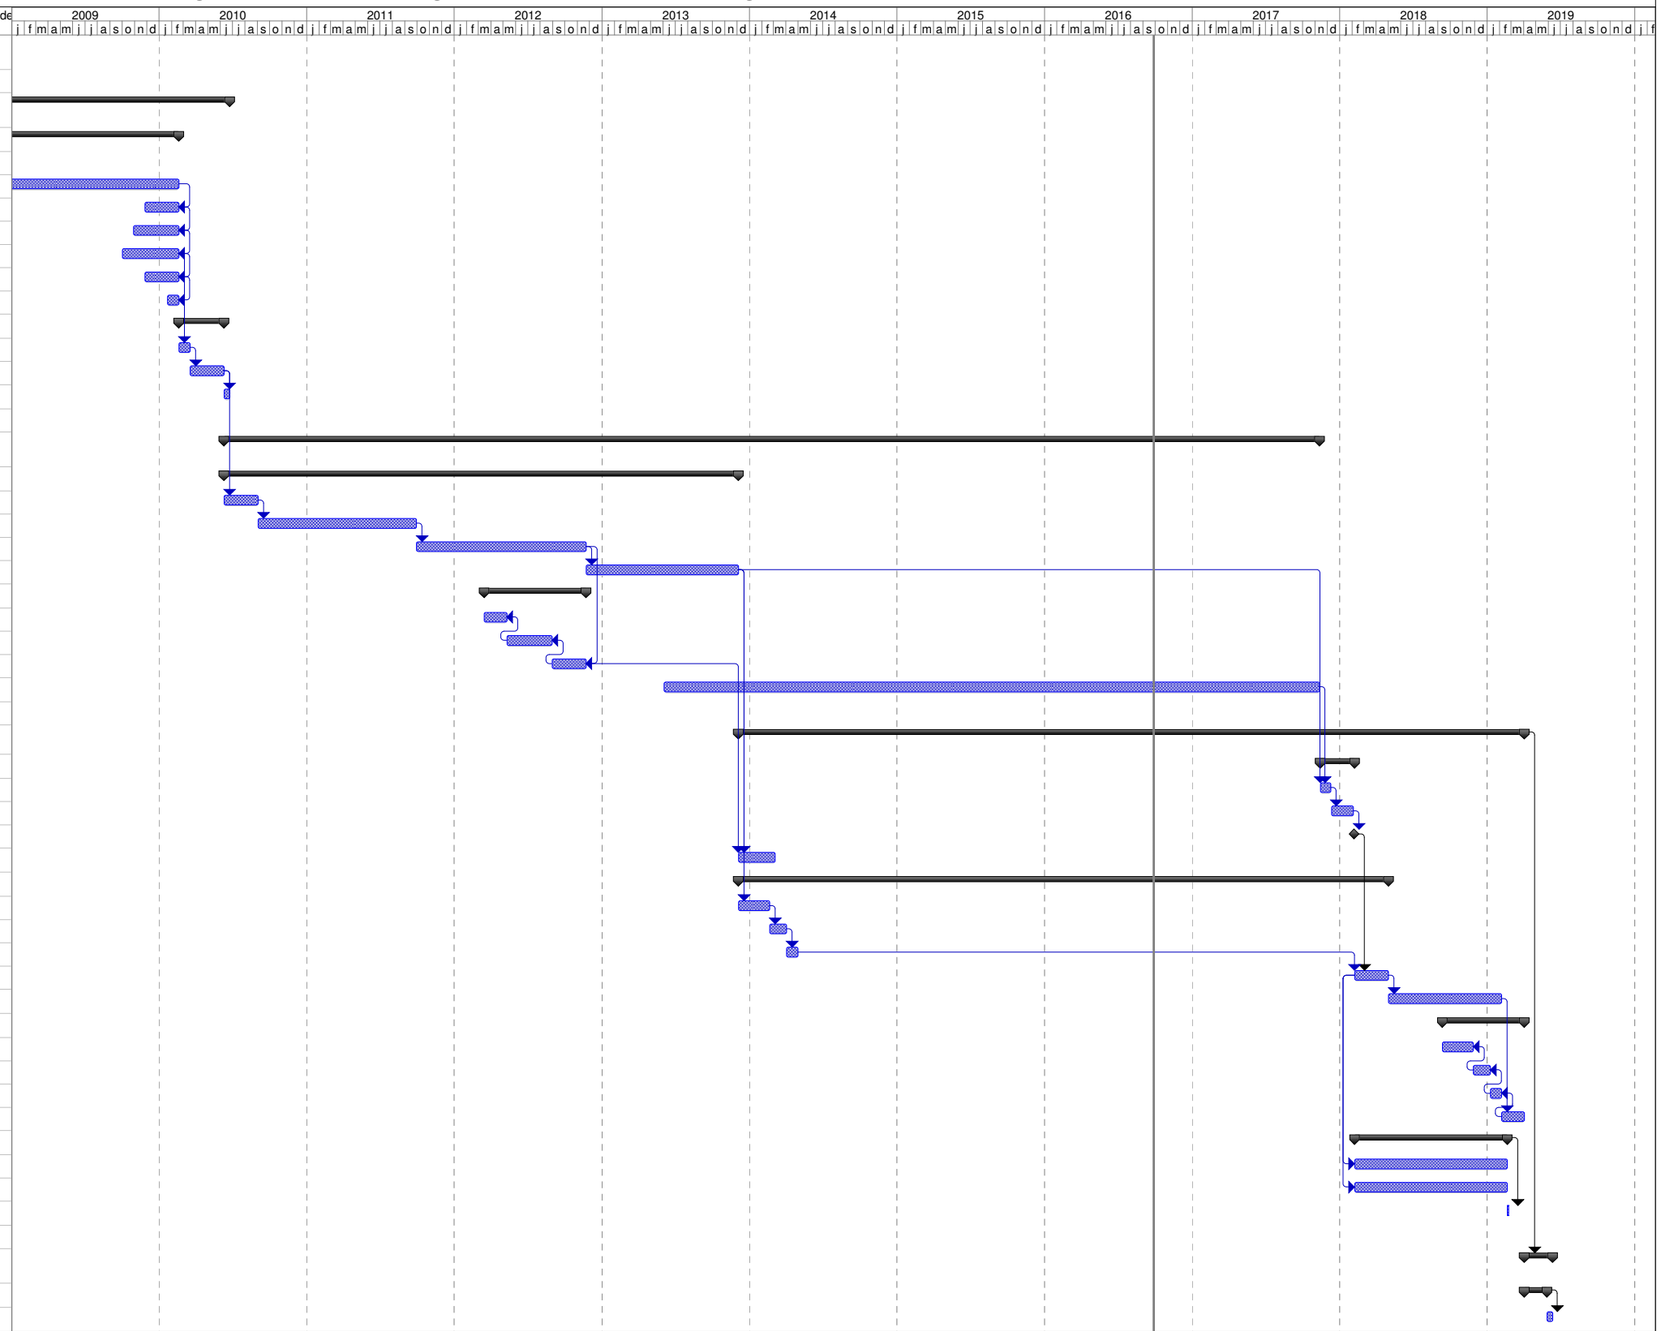

Project: basisprojectplanning S&P
Datum: woe 28-9-16

Taak	Samengevouwen taak	Splitsing	Groeperen op samenvattingskop	Inactieve mijlpaal	Alleen duur	Alleen begindatum
Mijlpaal	Samengevouwen mijlpaal	Externe taken	Inactieve taken	Inactieve samenvatting	Handmatige samenvatting	Alleen einddatum
Samenvatting	Samengevouwen voortgang	Projectsamenvatting	Inactieve taken	Handmatig taak	Handmatige samenvatting	Voortgang
