Planning project 110. Herontwikkeling RK-Kerk

Id	Voorafgaande taken	Taaknaam	Duur
1		**INITIATIEFFASE**	**1944 dagen?**
2		**Voorgeschiedenis**	**1642,5 dagen**
37		Gebiedsplan Moerdijk	105 dagen?
38	**21**	**Haalbaarheidsonderzoek 'dorpshart'**	**366 dagen**
39	37GB	Ideeën dorp	1 mnd
40	39	Definiëring uitgangspunten ontwerpopgave	2 mndn
41	40	Aanbesteding landschapsarchitect	2,5 mndn
42	41	Ontwerptraject met werkgroep	7 mndn
43	42	Dorpsbrede avond	2 wkn
44	43	Projectexploitatie	2 mndn
45	44	Collegebesluit voorbereiden	3 wkn
46	45	Besluit college	2 wkn
47	46	Besluit gemeenteraad	8 wkn
48	47	Afronding initiatieffase	1 dag
49			
50		**ONTWERPFASE**	
51		**Nadere ontwerptechnische uitwerking**	**170 dagen**
52	48	Uitwerking ontwerp tot besteksniveau	4 mndn
53	52	Opstellen aanbestedingsleidraad	1 mnd
54	53	Aanbestedingsprocedure	3,5 mndn
55		**Verwerving**	**300 dagen**
56	48	Overeenstemming randvoorwaarden verwerving	6 mndn
57	56	Opstellen koopovereenkomst	6 mndn
58	57	Afhandelen koopovereenkomst	59 dagen
59	58	Notarieel transport	1 dag
60			
61		**UITVOERINGSFASE**	
62		**Voorbereidingen**	**33 dagen**
63		Werkvoorbereiding aannemer	6,6 wkn
64		**Vergunningverlening**	**99 dagen**
65		Omgevingsvergunningsaanvraag	1 dag
66	65	Behandelingstermijn	68 dagen
67	66	Beroepstermijn	6 wkn
68		**Realisatie dorpshart**	**160 dagen**
69	59;63	Partiële sloop bestaande RK-kerk	3 mndn
70	69;64	Bouwrijp maken terrein	1 mnd
71	70	Terreininrichting	3 mndn
72	71	Oplevering terrein	1 mnd
73			
74		**AFRONDINGSFASE**	**125 dagen**
75		**Evaluatierapport**	**125 dagen**
76	72	Concept vervaardigen	4 mndn
77	76	Overeenstemming	1,5 mndn
78	77	Besluitvorming DT	1 wk
79	77	Besluitvorming B&W	3 wkn

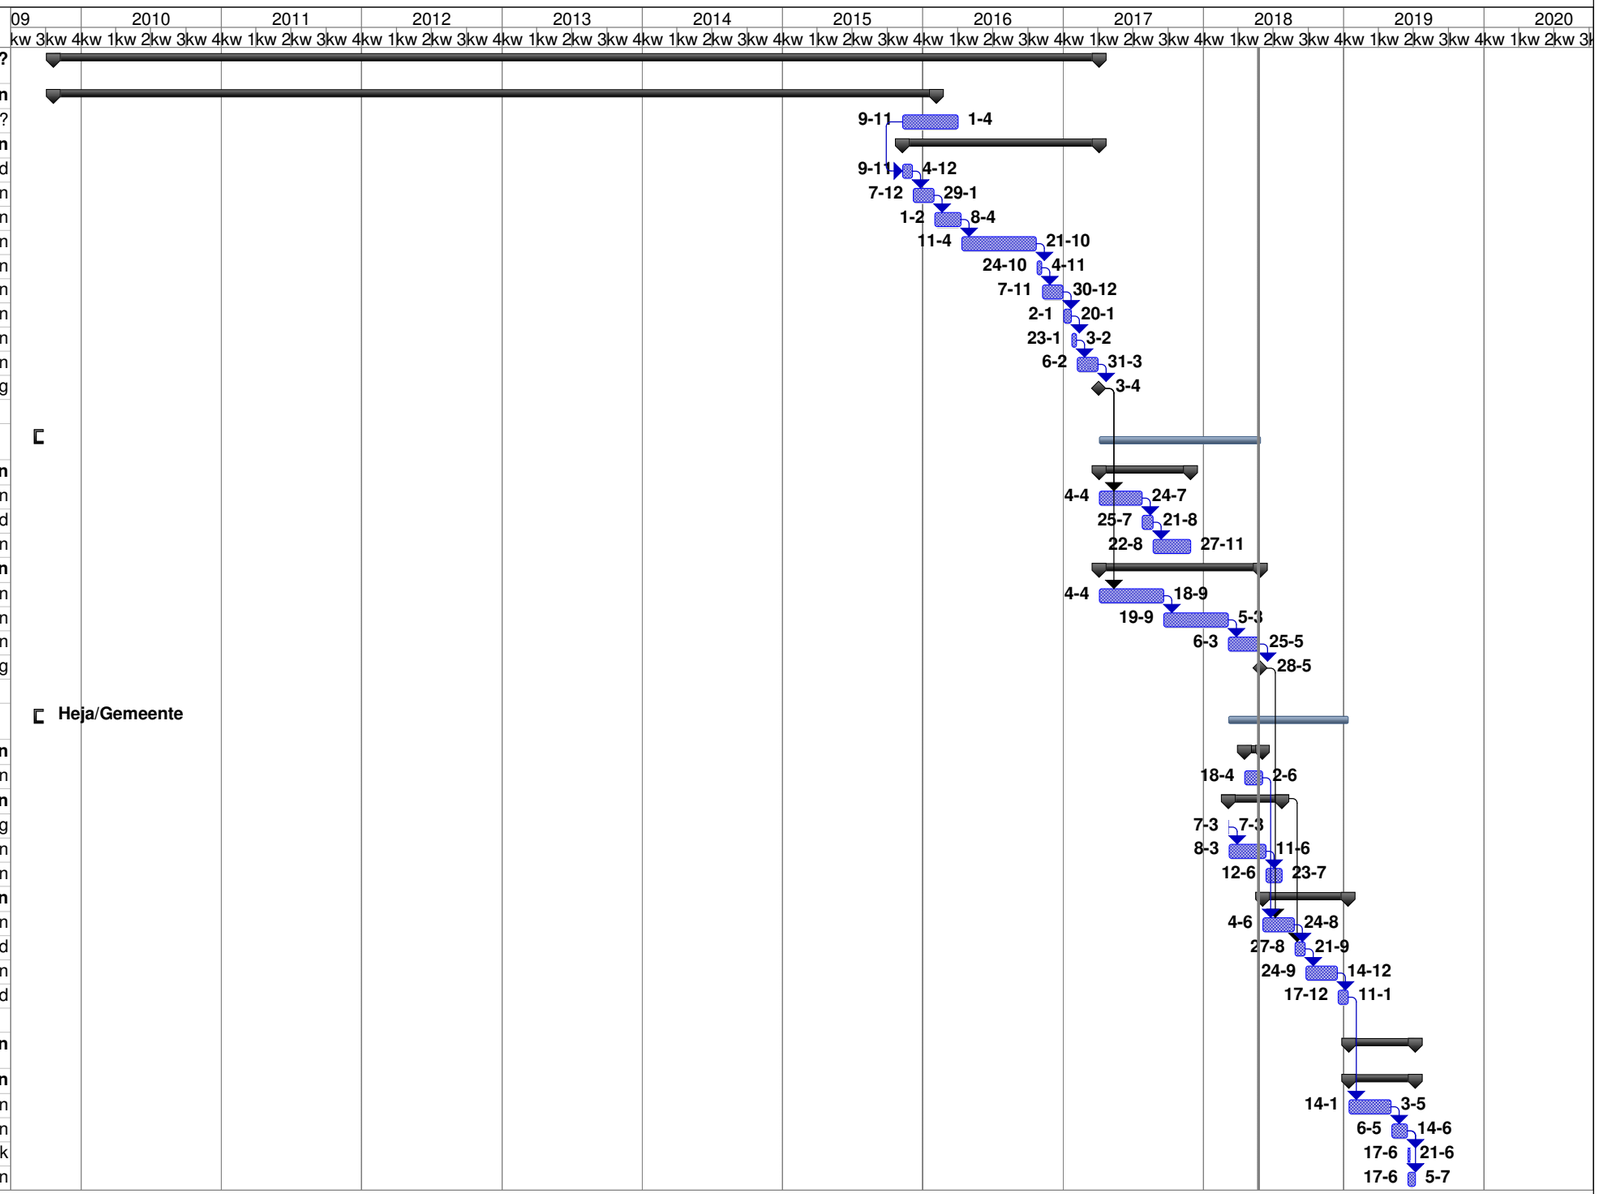

Project: 110. Herontwikkeling Rk-Kerk
Datum: don 24-5-18

Taak	Splitsing	Inactieve mijlpaal	Alleen begindatum		
Mijlpaal	Externe taken	Inactieve samenvatting	Alleen einddatum		
Samenvatting	Projectsamenvatting	Handmatig taak	Voortgang		
Samengevouwen taak	Groeperen op samenvattingskop	Alleen duur			
Samengevouwen mijlpaal	Inactieve taken	Handmatige samenvatting			
Samengevouwen voortgang	Inactieve taken	Handmatige samenvatting			
