Project 152
Noordhoeksedijk 12-14 Noordhoek

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken
1	Vorontwerp bestemmingsplan gereed	1 dag	maa 31-1-11	maa 31-1-11	
2		1 dag?	maa 3-1-11	maa 3-1-11	
3	**ONTWERPFASE**	**368 dagen**	**din 1-2-11**	**don 28-6-12**	
4	**Voorontwerp bestemmingsplan**	**61 dagen**	**din 1-2-11**	**din 26-4-11**	
5	Opstellen collegevoorstel	2 wkn	din 1-2-11	maa 14-2-11	1
6	Routing collegevoorstel	2 wkn	din 15-2-11	maa 28-2-11	5
7	Collegebesluit vaststelling voorontwerp	1 dag	din 1-3-11	din 1-3-11	6
8	Voorontwerp ter kennis van commissie en raad (RIB)	6 wkn	woe 2-3-11	din 12-4-11	7
9	Overleg provincie, waterschap en overigen	6 wkn	woe 2-3-11	din 12-4-11	7
10	Inspraakprocedure (publicatie en ter visie)	2 mndn	woe 2-3-11	din 26-4-11	7
11	**Ontwerp bestemmingsplan**	**96 dagen**	**woe 27-4-11**	**woe 7-9-11**	
12	Verwerken ingekomen inspraakreacties	1 mnd	woe 27-4-11	din 24-5-11	10
13	Opstellen voorstel en aanpassen ontwerp BP	1 mnd	woe 25-5-11	din 21-6-11	12
14	Routing collegevoorstel	2 wkn	woe 22-6-11	din 5-7-11	13
15	Collegebesluit vaststelling ontwerp	1 dag	woe 6-7-11	woe 6-7-11	14
16	Zienswijzenprocedure (publicatie en ter visie)	2 mndn	don 14-7-11	woe 7-9-11	15BE+1 wk
17	**Bestemmingsplan**	**132 dagen**	**don 8-9-11**	**vri 9-3-12**	
18	Verwerken ingekomen zienswijzen	4 wkn	don 8-9-11	woe 5-10-11	16
19	Opstellen voorstel en aanpassen BP	4 wkn	don 6-10-11	woe 2-11-11	18
20	Adviesnota en raadsvoorstel	2 wkn	don 3-11-11	woe 16-11-11	19
21	Besluit college	2 wkn	don 17-11-11	woe 30-11-11	20
22	Behandeling Commissie Fysieke Infrastructuur	3 wkn	don 1-12-11	woe 21-12-11	21
23	Routing raadsvoorstel	5 wkn	don 1-12-11	woe 4-1-12	21
24	Raadsbesluit	1 dag	don 5-1-12	don 5-1-12	23
25	Publicatie en ter visielegging	2 mndn	don 12-1-12	woe 7-3-12	23BE+1 wk
26	Beroepsprocedure Raad van State	1 dag	don 8-3-12	don 8-3-12	25
27	Bestemmingsplan onherroepelijk	1 dag	vri 9-3-12	vri 9-3-12	26
28	**(Steden)bouwkundig ontwerp**	**347 dagen**	**woe 2-3-11**	**don 28-6-12**	
29	Stedenbouwkundig ontwerp	3 mndn	woe 2-3-11	din 24-5-11	7
30	Inrichtingsplan openbare ruimte (VO)	3 mndn	woe 25-5-11	din 16-8-11	29
31	Inrichtingsplan openbare ruimte (DO)	3 mndn	woe 17-8-11	din 8-11-11	30
32	Bestek inrichting openbare ruimte	4 mndn	vri 9-3-12	don 28-6-12	26
33					
34	**UITVOERINGSFASE**	**1681 dagen**	**maa 12-3-12**	**maa 20-8-18**	
35	**Verkoop en uitgifte**	**860 dagen**	**maa 12-3-12**	**vri 26-6-15**	
36	Voorbereiding verkoop en uitgifte	3 mndn	maa 12-3-12	vri 1-6-12	27
37	Verkoop en uitgifte gronden	40 mndn	maa 4-6-12	vri 26-6-15	36
38	**Voorbereidingen**	**100 dagen**	**maa 29-6-15**	**vri 13-11-15**	
39	Aanbesteding inrichting openbare ruimte	5 mndn	maa 29-6-15	vri 13-11-15	37
40	**Vergunningverstrekking**	**720 dagen**	**maa 4-6-12**	**vri 6-3-15**	
41	Aanvraag omgevingsvergunning	36 mndn	maa 4-6-12	vri 6-3-15	36
42	Omgevingsvergunning woningbouw (sloop, bouw, aanl	36 mndn	maa 4-6-12	vri 6-3-15	36
43	**Bouw**	**821 dagen**	**maa 29-6-15**	**maa 20-8-18**	
44	Sloop aanwezige opstallen	1 mnd	maa 29-6-15	vri 24-7-15	37
45	Bouwrijp maken terrein	2 mndn	maa 27-7-15	vri 18-9-15	44
46	Bouwactiviteiten	36 mndn	maa 21-9-15	vri 22-6-18	45
47	Woonrijp maken terrein	2 mndn	maa 25-6-18	vri 17-8-18	46
48	Oplevering	1 dag	maa 20-8-18	maa 20-8-18	47
49					
50	**AFRONDINGSFASE**	**81 dagen**	**din 21-8-18**	**din 11-12-18**	
51	**Evaluatierapport**	**81 dagen**	**din 21-8-18**	**din 11-12-18**	
52	Evaluatiegesprekken	1 mnd	din 21-8-18	maa 17-9-18	48
53	Rapportage opstellen	1 mnd	din 18-9-18	maa 15-10-18	52
54	Besluit directie	1 mnd	din 16-10-18	maa 12-11-18	53
55	Besluit college	1 mnd	din 13-11-18	maa 10-12-18	54
56	Afsluiting project	1 dag	din 11-12-18	din 11-12-18	55

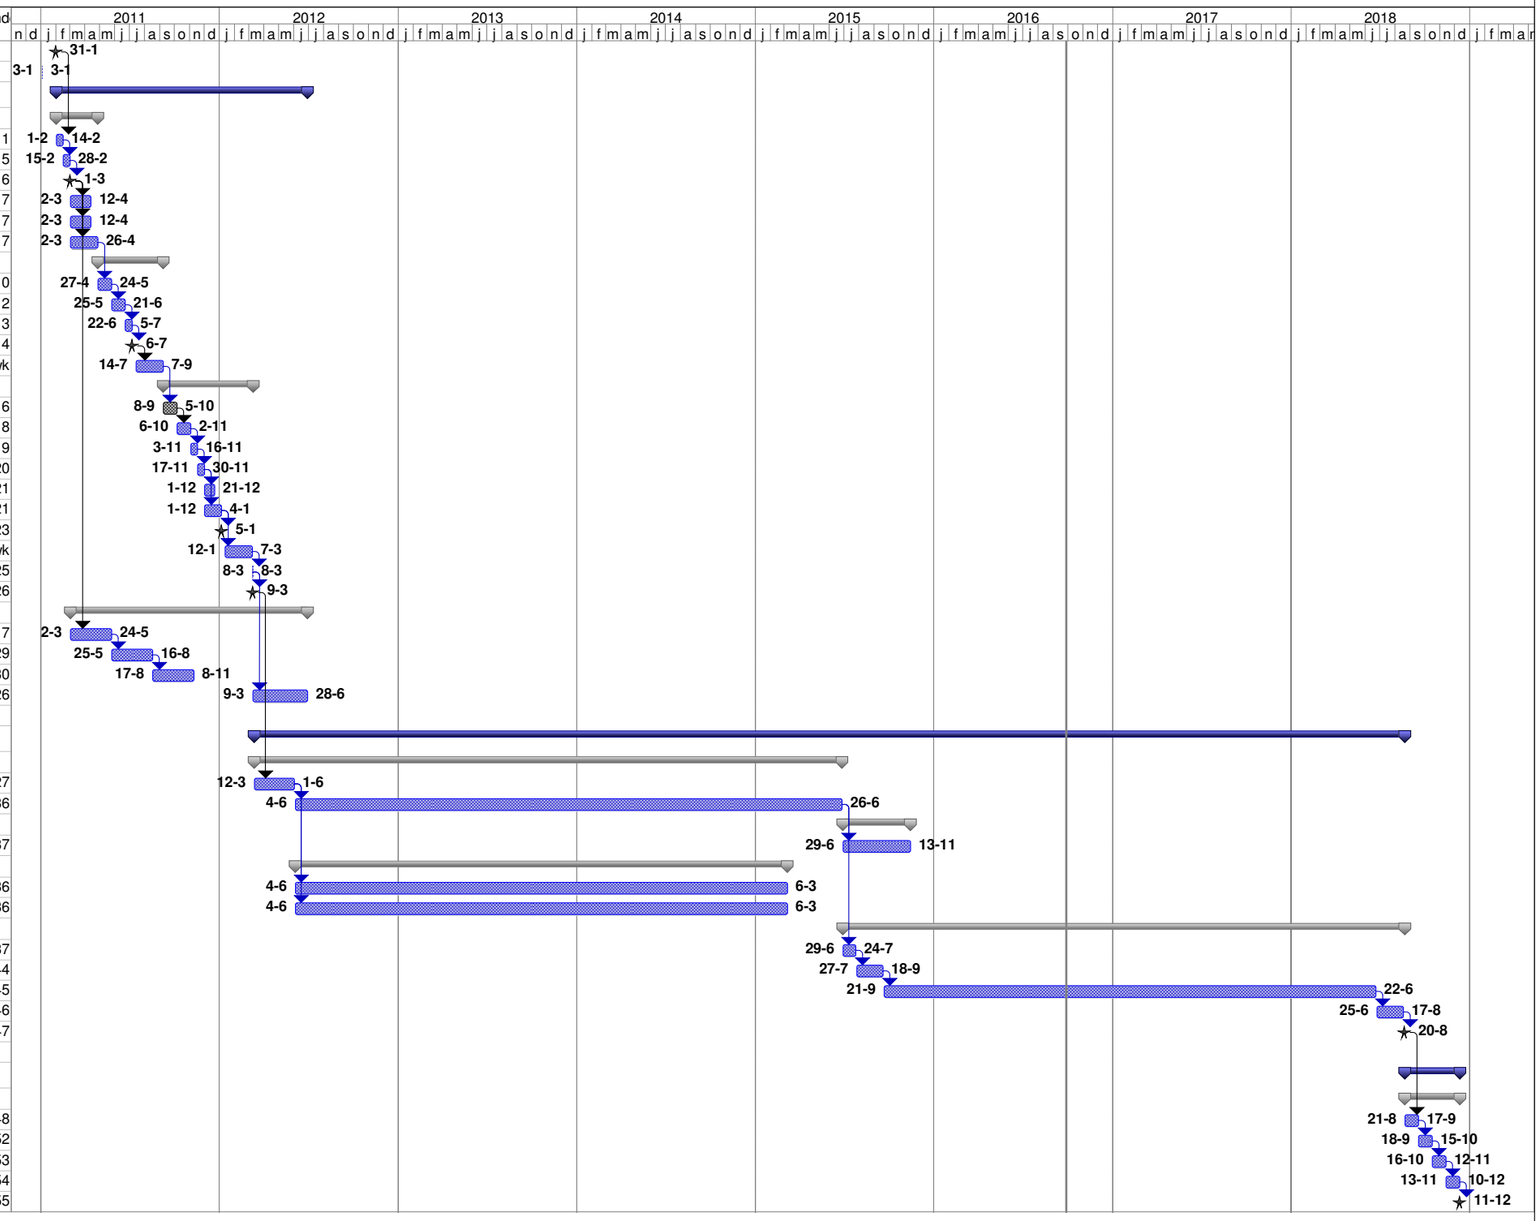

Project 152 Noordhoeksedijk 12-14 Noordhoek
Datum: woe 28-9-16

Taak	Samengevouwen voortgang	Inactieve taken	Alleen duur	Voortgang			
Mijlpaal	Splitsing	Inactieve taken	Handmatige samenvatting				
Samenvatting	Externe taken	Inactieve mijlpaal	Handmatige samenvatting				
Samengevouwen taak	Projectsamenvatting	Inactieve samenvatting	Alleen begindatum				
Samengevouwen mijlpaal	Groeperen op samenvattingskop	Handmatig taak	Alleen einddatum				
