Planning project 112. Permanente Regenboog (Lindonk 41)

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken
1	**Verlening bouwvergunning tijdelijke Regenboog**	1 dag	vri 10-10-08	vri 10-10-08	
2	**Vrijstellingstermijn tijdelijke Regenboog**	1304 dagen	vri 10-10-08	woe 9-10-13	1GB
3	**Verplaatsing SGZ naar sportpark de Knip**	457 dagen	**maa 1-2-10**	din 1-11-11	
4					
5	**ONTWERPFASE**	**559 dagen**	**maa 13-7-09**	**don 1-9-11**	
6	**Locatieontwikkelingsovereenkomst**	**65 dagen**	**woe 21-10-09**	**din 19-1-10**	
7	Eerste concept vervaardigen	4 wkn	woe 21-10-09	din 17-11-09	
8	Beoordeling door schoolbestuur en SWZ	3 wkn	woe 18-11-09	din 8-12-09	7
9	Aanpassingen verwerken in tweede concept	1 wk	woe 9-12-09	din 15-12-09	8
10	Resterende opmerkingen	1 wk	woe 16-12-09	din 22-12-09	9
11	Definitieve versie ter ondertekening	1 wk	woe 23-12-09	din 29-12-09	10
12	Besluit B&W	3 wkn	woe 30-12-09	din 19-1-10	11
13					
14	**Bouwplan school**	**356 dagen**	**maa 13-7-09**	**maa 22-11-10**	
15	Stedenbouwkundige randvoorwaarden	6 wkn	maa 13-7-09	vri 21-8-09	
16	Programma van Eisen	19 wkn	maa 24-8-09	vri 1-1-10	15
17	Architectenselectie	15 wkn	maa 24-8-09	vri 4-12-09	15
18	Gunning	4 wkn	maa 7-12-09	vri 1-1-10	17
19	Ontwerp vervaardigen o.g.v. PvE	**4 mndn**	maa 4-1-10	vri 23-4-10	18;16
20	*Aanvraag 1e fase bouwvergunning indienen*	3 dagen	maa 26-4-10	**woe 28-4-10**	19
21	Ontwerp verder uitwerken o.g.v. 1e fase bouwvergunning	2 mndn	don 29-4-10	woe 23-6-10	20
22	*Aanvraag 2e fase bouwvergunning indienen*	3 dagen	don 18-11-10	**maa 22-11-10**	21;48GE+1 d
23					
24	**Sloopvergunning en exploitatie**	**117 dagen**	**din 17-11-09**	**woe 28-4-10**	
25	Ramen kosten bouwrijp maken terrein Lindonk 41	16 wkn	din 17-11-09	maa 8-3-10	
26	Raming kosten aanleg buitenruimte	16 wkn	din 17-11-09	maa 8-3-10	25GE
27	Exploitatie opstellen	4 wkn	din 9-3-10	maa 5-4-10	26
28	Sloopvergunning terrein Lindonk 41 opmaken	7 wkn	din 9-3-10	maa 26-4-10	26
29	*Aanvraag sloopvergunning indienen*	2 dagen	din 27-4-10	**woe 28-4-10**	28
30					
31	**Ontwerp Bestemmingsplan**	**183 dagen**	**maa 17-8-09**	**woe 28-4-10**	
32	Voorontwerp bestemmingsplan (incl. onderzoeken)	97 dagen	maa 17-8-09	din 29-12-09	
33	Voorontwerp voor B&W	3 wkn	woe 30-12-09	din 19-1-10	32
34	Voorontwerp ter kennis van commissie en raad (RIB)	2 mndn	woe 20-1-10	din 16-3-10	33
35	Overleg provincie, waterschap en overigen	2 mndn	woe 20-1-10	din 16-3-10	33
36	Ter visielegging voorontwerp	31 dagen	don 28-1-10	don 11-3-10	33BE+6 dage
37	Verwerken ingekomen reacties	3 wkn	vri 12-3-10	don 1-4-10	36
38	Commentaarnota en ontwerp bp gereed	19 dagen	vri 2-4-10	**woe 28-4-10**	37
39					
40	**Planologische procedure (o.g.v. coördinatieregeling)**	**217 dagen**	**don 29-4-10**	**vri 25-2-11**	
41	Beoordeling bouwvergunning o.g.v. welstand en ontwerp bp	2 wkn	don 29-4-10	woe 12-5-10	38
42	*Ontwerp bp + 1e fase bouwverg. + sloopverg. ter instemming voor B&W*	14 dagen	don 13-5-10	din 1-6-10	29;41
43	Ontwerp bp + 1e fase bouwverg. + sloopverg. ter visie	6 wkn	**don 10-6-10**	woe 21-7-10	42BE+6 dage
44	Behandeling in B&W	14 dagen	don 22-7-10	**din 10-8-10**	43
45	Commissie FI	20 dagen	woe 11-8-10	din 7-9-10	44
46	Vaststelling gemeenteraad	12 dagen	woe 8-9-10	**don 23-9-10**	45
47	Ter visie vastgesteld bp + 1e fase bouwverg + sloopverg.	31 dagen	don 7-10-10	don 18-11-10	46BE+9 dage
48	*Onherroepelijk bestemmingsplan + 1e fase bouwverg. + sloopverg.*	1 dag	vri 19-11-10	**vri 19-11-10**	47
49	Beoordeling aanvraag 2e fase bouwvergunning	6 wkn	din 23-11-10	maa 3-1-11	48;22
50	Terinzagelegging periode	31 dagen	don 13-1-11	don 24-2-11	49BE+7 dage
51	Onherroepelijke (2e fase) bouwvergunning	1 dag	vri 25-2-11	**vri 25-2-11**	50
52					
53	**Bouwplan gymzaal (indien van toepassing)**	**487 dagen**	**woe 21-10-09**	**don 1-9-11**	
54	Bestuurlijke uitspraak over gymzaal	8 mndn	woe 21-10-09	din 1-6-10	
55	Gunning architect	6 wkn	maa 28-6-10	vri 6-8-10	54
56	Ontwerp vervaardigen	2 mndn	maa 9-8-10	vri 1-10-10	55
57	*Aanvraag omgevingsvergunning indienen*	3 dagen	**maa 28-2-11**	woe 2-3-11	56;51
58	Vergunningsprocedure o.g.v. Wabo	26 wkn	don 3-3-11	woe 31-8-11	57
59	*Onherroepelijke vergunning*	1 dag	don 1-9-11	**don 1-9-11**	58
60					
61	**UITVOERINGSFASE**	**880 dagen**	**maa 22-11-10**	**vri 4-4-14**	
62	**Bouwrijp maken**	**333 dagen**	**maa 22-11-10**	**woe 29-2-12**	
63	Gunning sloop Lindonk 41	6 wkn	maa 22-11-10	vri 31-12-10	48
64	Voorbereidingen sloper	8 wkn	woe 7-9-11	woe 2-11-11	63;65EB
65	Nutswerkzaamheden	6 wkn	woe 2-11-11	din 13-12-11	3
66	Sloop Lindonk 41 + terrein bouwrijp maken	56 dagen	woe 14-12-11	woe 29-2-12	65
67					
68	**Bouw**	**547 dagen**	**don 1-3-12**	**vri 4-4-14**	66
69	Realisatie school + buiterterrein	307 dagen	don 1-3-12	vri 3-5-13	51
70	Controle (incl. hieropvolgende aanpassingen)	7 mndn	maa 6-5-13	vri 15-11-13	69
71	Weekmeting (incl. resultaten en mogelijke aanpassingen)	5 mndn	maa 18-11-13	vri 4-4-14	70
72	Realisatie gymzaal	307 dagen	don 1-3-12	vri 3-5-13	59
73	Realisatie openbaar gebied	65 dagen	maa 1-4-13	vri 28-6-13	69BE-5 wkn
74					
75	**AFRONDINGSFASE**	**252 dagen**	**maa 1-7-13**	**din 17-6-14**	
76	Oplevering school aan schoolbestuur	1 dag	maa 1-7-13	**maa 1-7-13**	73
77	Grondtransacties	4 wkn	din 2-7-13	maa 29-7-13	76
78	Verhuizing Regenboog van tijdelijke locatie naar permanent	1 wk	din 2-7-13	maa 8-7-13	76
79	Bouwvakantie	5 wkn	maa 15-7-13	vri 16-8-13	
80	Ontmantelen tijdelijke school	2 mndn	maa 19-8-13	vri 11-10-13	79
81	Einde looptijd vrijstelling tijdelijke locatie Regenboog	1 dag	don 10-10-13	**don 10-10-13**	
82	Herstellen evenemententerrein	7 mndn	maa 14-10-13	vri 25-4-14	80
83	Evaluatie opstellen	37 dagen	maa 7-4-14	din 27-5-14	80;71
84	Besluit college	3 wkn	woe 28-5-14	din 17-6-14	83

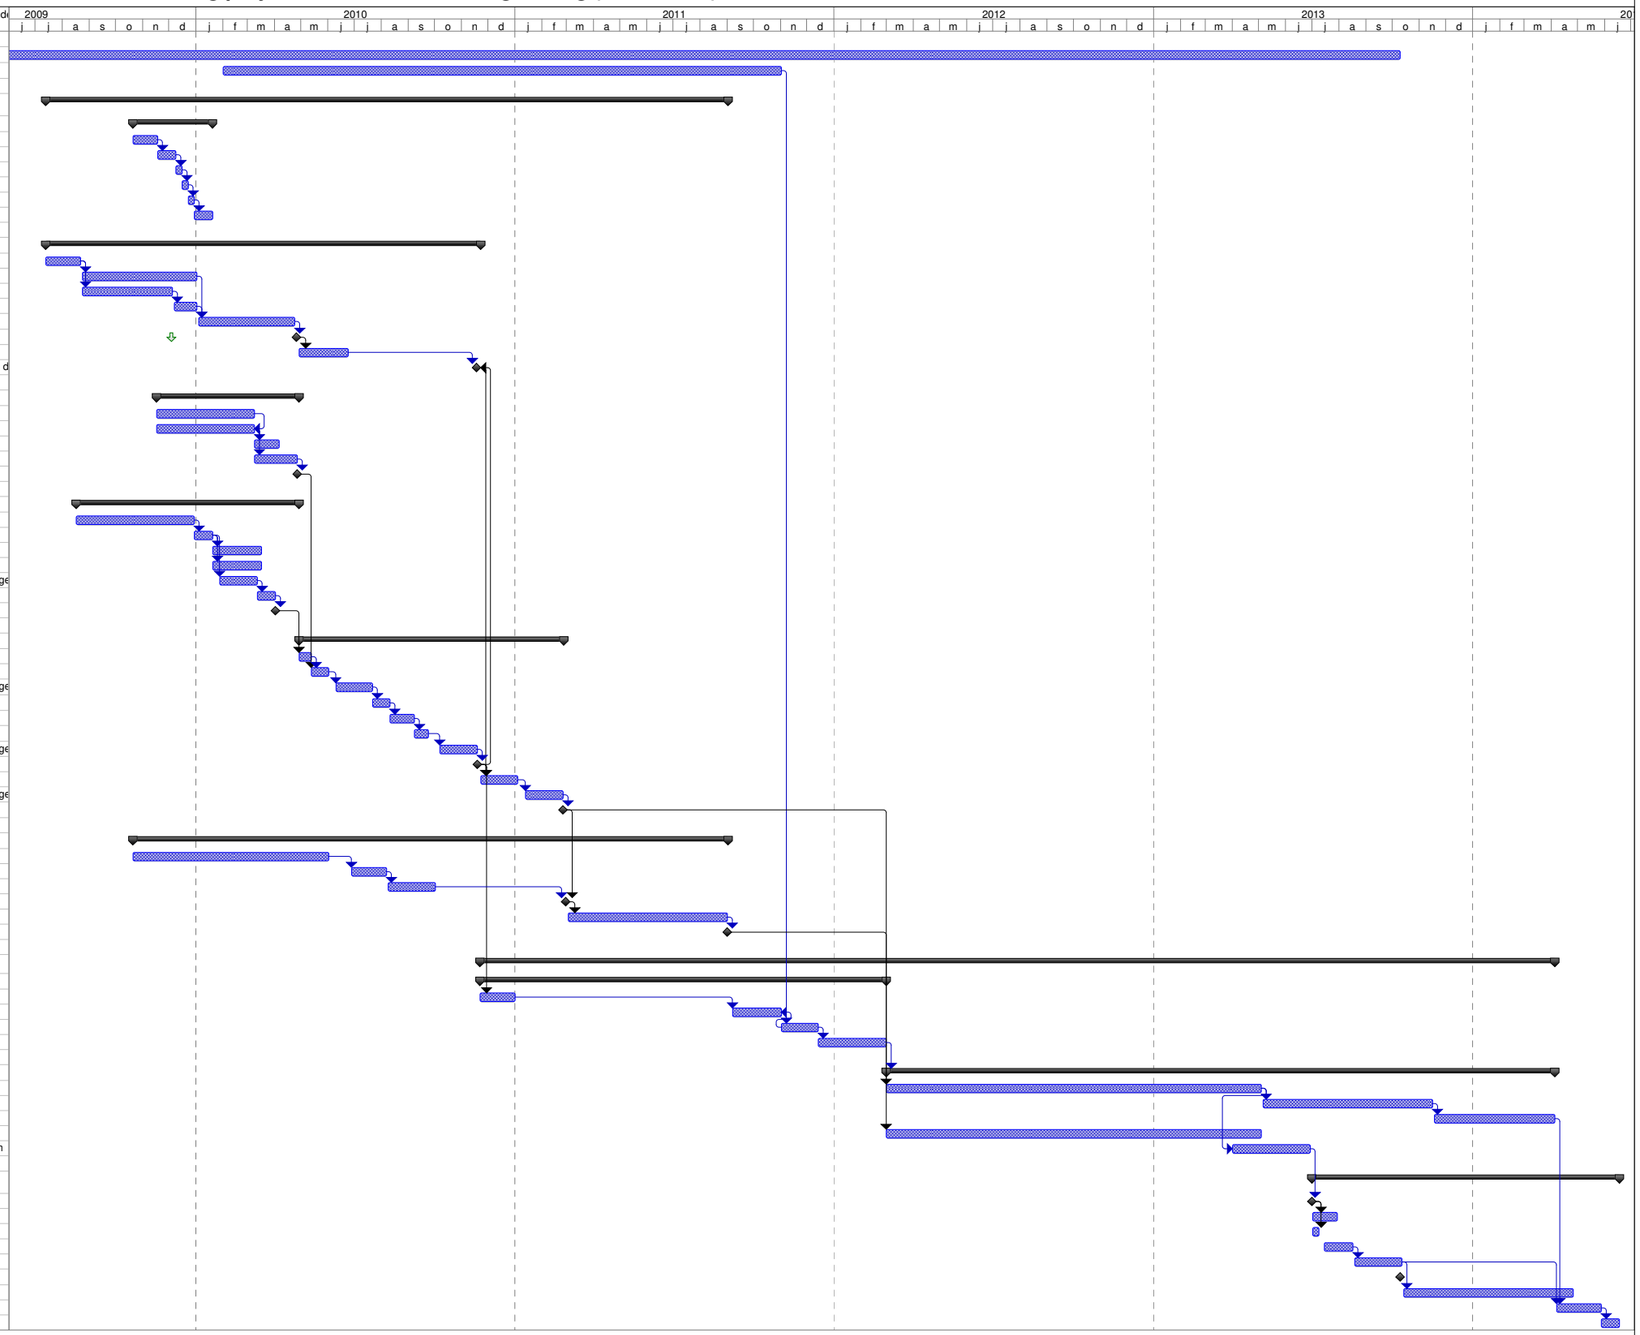

Project 112. Permanente Regenboog
Versie 1
Datum: don 23-7-15

Taak · Mijlpaal · Samengevouwen taak · Samengevouwen mijlpaal · Samengevouwen voortgang · Splitsing · Externe taken · Projectsamenvatting · Groeperen op samenvattingskop · Inactieve taken · Inactieve taken · Inactieve mijlpaal · Inactieve samenvatting · Handmatig taak · Alleen duur · Handmatige samenvatting · Handmatige samenvatting · Alleen begindatum · Alleen einddatum · Voortgang
